

# Datacenter CITI e Atualizações

**VI Workshop do POP-RS e Reunião da Rede Tchê**

Jussara Issa Musse

UFRGS-CPD



# CITI – Centro Integrado de TI

- Projeto conjunto UFRGS e HCPA
- Datacenter de 1000 m<sup>2</sup> que abrigará:
  - dc do CPD/UFRGS
  - dc do CESUP/UFRGS
  - dc do HCPA
  - POP-RS
  - MetroPOA
  - PTT-RS


- Previsão de entrega: setembro de 2015
- Previsão atual: setembro de 2017
  
- Construtora: ACECO TI



<b>ATIVIDADE</b>	Instalação das placas do revestimento ACM
<b>INÍCIO REAL</b>	24/05/2016
<b>TÉRMINO REAL</b>	
<b>STATUS</b>	Em andamento



<b>ATIVIDADE</b>	Aplicação de massa corrida nas paredes do 6º pavimento
<b>INÍCIO REAL</b>	14/03/2016
<b>TÉRMINO REAL</b>	
<b>STATUS</b>	Em andamento

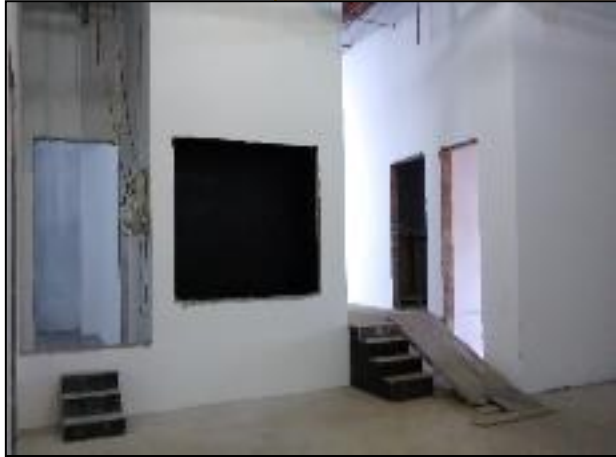

<b>ATIVIDADE</b>	Assentamento dos pisos cerâmicos nas áreas frias do 6º pavimento
<b>INÍCIO REAL</b>	08/09/2016
<b>TÉRMINO REAL</b>	
<b>STATUS</b>	Em andamento





<b>ATIVIDADE</b>	Pintura com selador nas áreas técnicas do térreo
<b>INÍCIO REAL</b>	16/09/2016
<b>TÉRMINO REAL</b>	
<b>STATUS</b>	Em andamento





<b>ATIVIDADE</b>	Instalação da infraestrutura Elétrica – Sala de Geradores
<b>INÍCIO REAL</b>	18/05/2016
<b>TÉRMINO REAL</b>	
<b>STATUS</b>	Em andamento



<b>ATIVIDADE</b>	Instalação da infraestrutura Elétrica – Sala de UPS (Térreo)
<b>INÍCIO REAL</b>	18/05/2016
<b>TÉRMINO REAL</b>	
<b>STATUS</b>	Em andamento



<b>ATIVIDADE</b>	Impermeabilização das bases das antenas da UFRGS
<b>INÍCIO REAL</b>	09/03/2016
<b>TÉRMINO REAL</b>	11/03/2016
<b>STATUS</b>	Concluído







<b>ATIVIDADE</b>	Escavação para a instalação da infraestrutura de Telecomunicações – trecho 9
<b>INÍCIO REAL</b>	08/03/2016
<b>TÉRMINO REAL</b>	18/03/2016
<b>STATUS</b>	Concluído





<b>ATIVIDADE</b>	Escavação para a instalação da infraestrutura de Telecomunicações nos trechos 12 a 16
<b>INÍCIO REAL</b>	28/04/2016
<b>TÉRMINO REAL</b>	
<b>STATUS</b>	Em andamento



Esperamos recebê-los no CITI no próximo Workshop, em 2018.
